

SISTEM MONITORING
TIM EVALUASI & PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN



Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA)



**Kebijakan
SISMONTEP
RA**

**Perubahan
Proses Bisnis
SISMONTEPRA**

**Modul
Pelaporan
TEPRA**

Dasar Pelaksanaan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



 **Kembali**

Dasar Pelaksanaan


Pasal 4



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TEPR, para Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, pimpinan Sekretariat Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya:

- a. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan program Pemerintah;
- b. menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh TEPR;
- c. menentukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPR;
- d. menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala di minggu pertama setiap bulannya kepada TEPR sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan selanjutnya untuk dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan Sekretaris Kabinet; dan
- e. melaporkan hambatan-hambatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada TEPR.



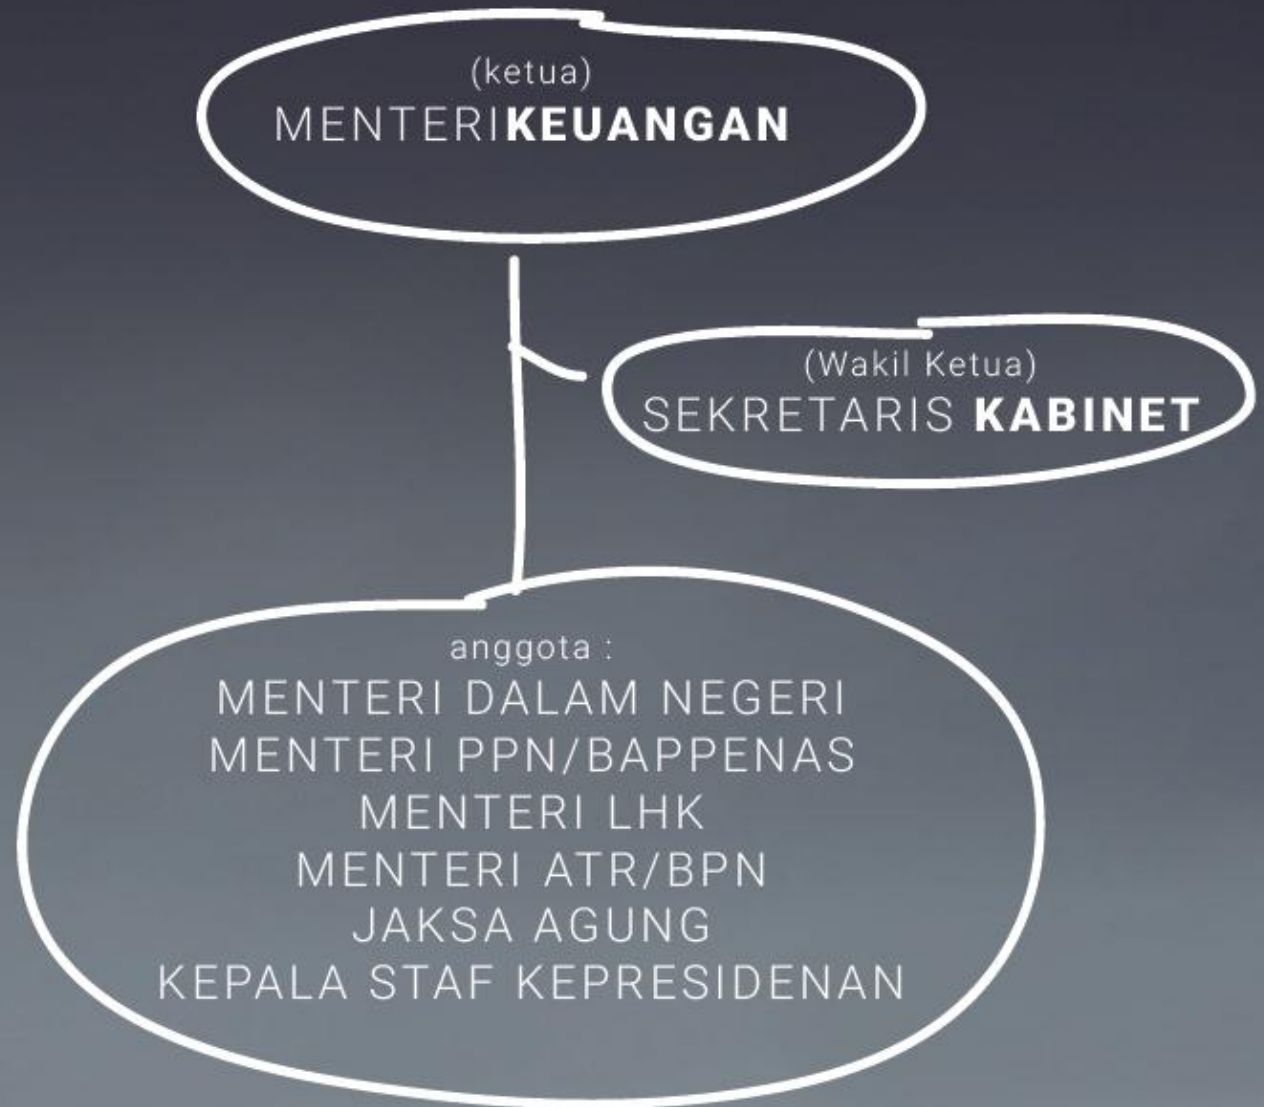

TIM PENGARAH

TEPRA

 **Kembali**



TIM PELAKSANA TEPRA

TEPRA

 **Kembali**

TUGAS

- 1 Menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan
- 2 Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan
- 3 Melaporkan secara berkala
- 4 Membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi
- 5 Mendorong pembentukan tim TEPPRA

Peran Pejabat Penghubung Dalam mendukung SISMONTeptra



- Mengkonsolidasikan data Anggaran dan Pengadaan di tiap K/L/D/I;
- Mengkoordinasikan Satker/SKPD dalam pelaporan Sismonteptra (jika diperlukan);
- Memberikan saran, usulan dan rekomendasi terkait permasalahan realisasi anggaran.
- Melaporkan data pada Sismonteptra **paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya untuk pelaporan bulan sebelumnya**
- Meminta pembukaan blokir Sismonteptra **melalui sistem** atau email ke **sekretariat TEPRA** (jika diperlukan)

Safari File Edit View History Bookmarks Window Help

moneyev.go.id

TEPRA

THE TRANSPARENCY AND INTEGRITY PLATFORM FOR REALISING GOOD GOVERNANCE

Domanda Download Profil Pengadaan Monitor Pelanggaran Login

ANGGARAN MURNI ANGGARAN PERUBAHAN

Laporan Nasional Tahun: 2015

Tampilkan data untuk Insanai

Rencana Paket Pengadaan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa Sat. Model	Paket Pengadaan Strategis						Paket Pengadaan Non Strategis						TOTAL	
	Lelang Umum Seleksi Umum Lelang Tertutup		Penunjukan Langsung Seleksi Sederhana		Penunjukan Langsung Seleksi Sederhana		Penunjukan Langsung Seleksi Sederhana		Penunjukan Langsung Seleksi Sederhana					
	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M				
BARANG	11.034	48.427,10	17.034	17.034,05	17.034	17.034,05	17.034	17.034,05	17.034	17.034,05	17.034	17.034,05	17.034	17.034,05
KONSULTANSI	20.034	272.281,32	40.034	35.648,10	17.572	4.523,18	536	72,32	38.240,108	3.471,08	174.002	025.037,87	174.002	025.037,87
KONSULTANSI	14.118	14.081,79	15.846	2.127,00	11.649	1.137,07	172	8,62	52.176	1.550,04	80.003	18.883,31	80.003	18.883,31
JASA LAINNYA	3.206	20.182,17	4.531	4.101,41	12.115	2.875,86	53	7,04	40.003	4.870,08	01.010	44.100,29	01.010	44.100,29
Jumlah	56.877	560.069,86	76.817	68.003,29	07.003	15.408,01	027	425,24	487.914	1.000,02	025.333	55.034,50	1.104.737	579.227,51

SISMONTEPRA
(moneyev.go.id)

↶ Kembali



Perubahan Proses Bisnis SISMONTEPRA untuk Tahun 2017



TEPRA

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Kementerian PPN/
Bappenas



[Beranda](#) [Summary data Instansi](#) [Monitor Satker](#) [Download](#) [Profil Pengadaan](#) [Latihan Money](#)

Selamat datang, pejabatpenghubung-l36!

ANGGARAN MURNI

ANGGARAN PERUBAHAN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun: 2016

Keterangan:

Tab anggaran murni dan anggaran perubahan dihilangkan, sehingga informasi akan tercakup dalam 1 halaman saja. Segala perubahan dilakukan dalam 1 halaman aplikasi.


 **Kembali**

Struktur Anggaran

TOTAL ANGGARAN

JUMLAH SATKER

PEJABAT PENGHUBUNG

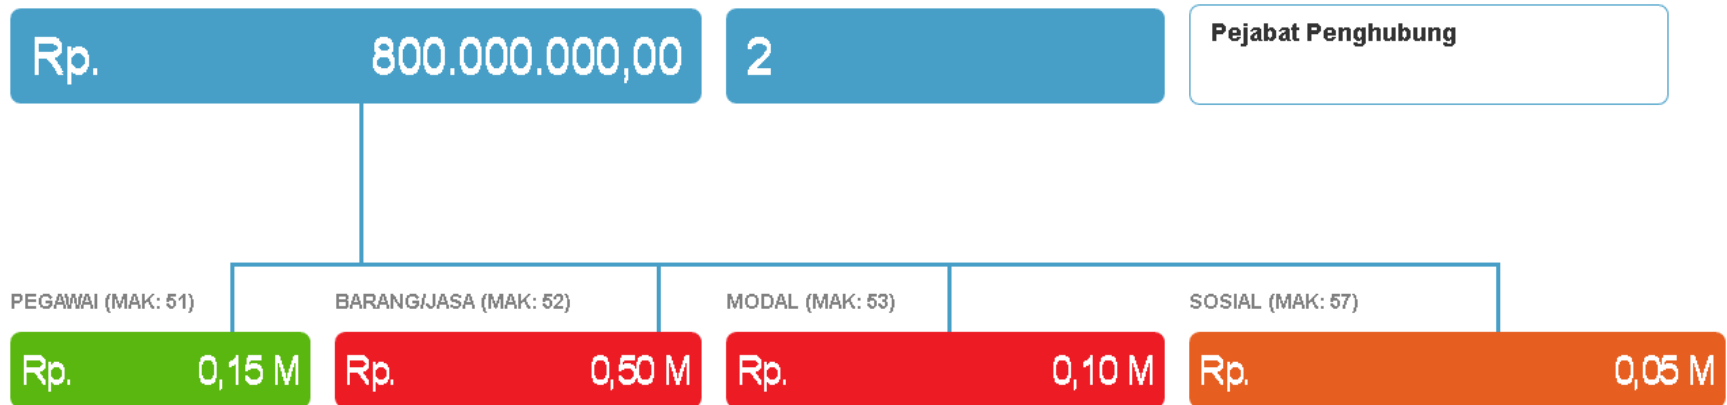

Keterangan:

Tabel struktur anggaran tidak terkunci, dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. Tidak lagi diperlukan pelaporan jumlah paket pengadaan barang/jasa

 **Kembali**

Rencana Paket Pengadaan

Rencana Paket Pengadaan

 Pembaruan Perencanaan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa dan Modal	Paket Pengadaan Strategis						Paket Pengadaan Non Strategis						TOTAL	
	Lelang Umum Seleksi Umum Lelang Terbatas		Pemillihan Langsung Lelang Sederhana Seleksi Sederhana		Penunjukan Langsung		Sayembara Kontes		Pengadaan Langsung e-Purchasing		Swakelola			
	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M	Pkt	Rp M
BARANG	6	6,41	3	2,60	1	3,60	0	0,00	133	18,00	-	-	143	30,61
KONSTRUKSI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00
KONSULTANSI	2	0,90	14	4,44	2	0,42	0	0,00	75	4,65	-	-	93	10,41
JASA LAINNYA	6	13,11	7	4,33	18	2,06	0	0,00	225	16,30	-	-	256	35,80
Jumlah	14	20,42	24	11,37	21	6,08	0	0,00	433	38,95	194	135,16	686	211,98

Rencana Paket Pengadaan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										Swakelola		TOTAL	
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar				Penyedia + swakelola	
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
BARANG	2	2,00	2	1,00	3	3,00	5	5,00	4	4,00	-	-	16	15,00
KONSTRUKSI	2	2,00	2	1,00	3	3,00	5	5,00	4	4,00	-	-	16	15,00
KONSULTANSI	2	2,00	2	1,00	3	3,00	5	5,00	4	4,00	-	-	16	15,00
JASA LAINNYA	2	2,00	2	1,00	3	3,00	5	5,00	4	4,00	-	-	16	15,00
Jumlah	8	8,00	8	4,00	12	12,00	20	20,00	16	16,00	0	0,00	64	60,00

Keterangan:

Pelaporan tabel Rencana Paket Pengadaan mulai tahun 2017 diubah sudut pandangnya, menjadi *range* nilai paket, dengan tetap menarik data dari SiRUP

 **Kembali**

Progres Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	3	9	20	30	39	49	57	67	78	86	94	100
Proyeksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisasi	0.83	3.11	7.84	14.7	19.04	27.47	29.06	29.06				

Keterangan:

Dalam menginput tabel progress keuangan, sebelumnya adalah persentase, diubah menjadi penginputan nilai nominal riil tiap bulannya, sistem akan mengkalkulasi secara otomatis penyerapan anggaran terhadap struktur anggaran yang diinputkan di Sismonteptra, dan akan tampil sebagai persentase penyerapan di halaman utama.

Catatan:

Untuk K/L, progres keuangan akan tetap menarik data otomatis dari SPAN, sedangkan untuk Pemerintah Daerah tetap melaporkan data keuangan secara manual.

 **Kembali**

Tampilkan Tabel Akumulasi Satker / SKPD

Progres Keuangan

Total anggaran : Rp.800.000.000,0

	Target(Rp)	Proyeksi(Rp)	Realisasi(Rp)
Bulan 1	50000000	0	0
Bulan 2	100000000	0	0
Bulan 3	150000000	0	0
Bulan 4	200000000	0	0
Bulan 5	250000000	0	0
Bulan 6	300000000	0	0
Bulan 7	350000000	0	0
- - -			

Keterangan:

Perubahan tampilan format pelaporan Progres Keuangan. Terdapat data pembandingan Total Anggaran yang dimiliki berdasarkan hasil pelaporan Struktur Anggaran sebelumnya.

 **Kembali**

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	Total Aktivitas Strategis: 59 paket / Rp. 37,87 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Proses Pengadaan		32.20%	44.07%	50.85%	54.24%	62.71%	62.71%	62.71%	0.00%	-	-	-	-
Tanda Tangan Kontrak		16.95%	37.29%	38.98%	49.15%	49.15%	57.63%	57.63%	0.00%	-	-	-	-
Pelaksanaan		13.56%	23.73%	33.90%	40.68%	49.15%	50.85%	57.63%	0.00%	-	-	-	-
PHO		1.69%	3.39%	5.08%	6.78%	10.17%	10.17%	13.56%	0.00%	-	-	-	-

Keterangan:

Tabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya memonitor paket berdasarkan klasifikasi “aktivitas strategis” akan digantikan dengan hanya monitoring paket dengan nilai lebih dari Rp 200 juta. Tahapan pengadaan juga akan diubah menjadi sebagaimana tabel di slide selanjutnya

 **Kembali**

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 200 juta < 2.5 Miliar) : 156256 paket / Rp. 0,00 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	26	28	29	32	48	57	67	89	97	109	109	-
	%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	-
Hasil Pemilihan	Paket	22	25	28	30	35	40	46	58	69	85	85	-
	%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	-
Kontrak	Paket	16	19	21	23	31	36	41	48	60	78	78	-
	%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	-
Serah Terima	Paket	10	15	17	20	22	28	34	43	52	67	67	-
	%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	-

Keterangan:

Pelaporan Proses Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi 3 tabel yaitu :

- Total paket pengadaan dengan nilai > **200 juta s.d. < 2.5 miliar**
- Total paket pengadaan dengan nilai > **2.5 miliar s.d. < 50 miliar**
- Total paket pengadaan dengan nilai > **50 miliar**

 **Kembali**

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 2.5 miliar < 50 Miliar) : 570 paket / Rp. 0,00 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	3	5	5	6	7	9	11	12	13	16	16	-
	%	0.53%	0.88%	0.88%	1.05%	1.23%	1.58%	1.93%	2.11%	2.28%	2.81%	2.81%	-
Hasil Pemilihan	Paket	2	2	3	4	5	6	7	9	10	13	13	-
	%	0.35%	0.35%	0.53%	0.70%	0.88%	1.05%	1.23%	1.58%	1.75%	2.28%	2.28%	-
Kontrak	Paket	1	1	1	2	3	5	6	7	8	12	12	-
	%	0.18%	0.18%	0.18%	0.35%	0.53%	0.88%	1.05%	1.23%	1.40%	2.11%	2.11%	-
Serah Terima	Paket	0	0	0	1	2	4	5	6	7	11	11	-
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	0.35%	0.70%	0.88%	1.05%	1.23%	1.93%	1.93%	-

Keterangan:

Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu :

- Total paket pengadaan dengan nilai
> 2.5 miliar s.d. < 50 miliar

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 50 Miliar) : 25274 paket / Rp. 0,00 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	51	56	62	73	84	91	92	93	116	135	135	-
	%	0.20%	0.22%	0.25%	0.29%	0.33%	0.36%	0.36%	0.37%	0.46%	0.53%	0.53%	-
Hasil Pemilihan	Paket	50	54	60	70	78	83	86	91	106	116	116	-
	%	0.20%	0.21%	0.24%	0.28%	0.31%	0.33%	0.34%	0.36%	0.42%	0.46%	0.46%	-
Kontrak	Paket	20	22	27	38	44	52	58	64	70	70	70	-
	%	0.08%	0.09%	0.11%	0.15%	0.17%	0.21%	0.23%	0.25%	0.28%	0.28%	0.28%	-
Serah Terima	Paket	15	15	16	19	22	29	32	35	40	50	50	-
	%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%	0.09%	0.11%	0.13%	0.14%	0.16%	0.20%	0.20%	-

Keterangan:

Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu :

- Total paket pengadaan dengan nilai > 50 miliar

PERMINTAAAN BUKA PEMBAHARUAN



1. Pengembangan Sismontepra diselaraskan dengan pengembangan SiRUP versi 2 dan pengembangan aplikasi lainnya.
2. Pelaporan Progres Keuangan, Fisik, dan Proses PBJ yang sudah terkunci, dapat dilakukan permintaan pembukaan blokir melalui fungsi tombol **“Permintaan Buka Pembaharuan”** di menu akun Pejabat Penghubung. Setiap permintaan buka pembaharuan akan tercatat pada sistem.

Beranda Summary data Instansi Summary data Satker Download ▾ Profil Pengadaan Latihan Money Selamat datang, catur! ▾

 Ganti Password
 Profil
 Logout

Informasi Login

Username : catur

Satuan Kerja : KECAMATAN TANAH SAREAL

Email : qinuku@yahoo.com

Detil Informasi

Nama : Catur Dewi Prawitasari2

NIP Pegawai : 198112052006042024

Golongan : III/c

Keterangan:

Fitur Profil disediakan agar Admin PPE, Admin Pejabat Penghubung dan Admin PA/KPA dapat memperbarui data diri secara mandiri

 **Kembali**

“Paket-paket yang dimonitor dalam Tabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa hanya paket yang bernilai lebih dari Rp 200 juta, dengan pertimbangan jumlah nilai paket-paket tersebut berkontribusi lebih dari 50% anggaran pengadaan di seluruh Indonesia dan paket tersebut berkontribusi terhadap Program Strategis Pemerintah”

Modul Pelaporan TEPRA



**Struktur
Anggaran**



**Rencana
Paket
Pengadaan**



**Progres
Keuangan**



**Progres
Fisik**



**Fitur
Proyeksi
Realisasi
Keuangan**



**Fitur Buka
Pemblokiran
untuk
Pembaruan**

 **Kembali**

Struktur anggaran K/L

Struktur Anggaran

TOTAL ANGGARAN

Rp. 800.000.000,00

JUMLAH SATKER

2

PEJABAT PENGHUBUNG

Pejabat Penghubung

PEGAWAI (MAK: 51)

Rp. 0,15 M

BARANG/JASA (MAK: 52)

Rp. 0,50 M

MODAL (MAK: 53)

Rp. 0,10 M

SOSIAL (MAK: 57)

Rp. 0,05 M

Sumber Data

Metode Pengisian

Frekuensi Pengisian

: Struktur APBN/APBD K/L/D/I

: Input manual oleh Pejabat Penghubung

: setiap saat struktur anggaran dapat diperbarui

 **Kembali**

Struktur anggaran Daerah



- Sumber Data** : Struktur APBN/APBD K/L/D/I
- Metode Pengisian** : Input manual oleh Pejabat Penghubung
- Frekuensi Pengisian** : setiap saat struktur anggaran dapat diperbarui

Struktur anggaran Daerah

Struktur Anggaran

 [Pembaruan Struktur Anggaran](#)

TOTAL ANGGARAN

Rp.

5.000.000.000,00

JUMLAH SATKER

-

PEJABAT PENGHUBUNG

Pejabat Penghubung

PEGAWAI (MAK: 51)

Rp.

1,00 M

BARANG/JASA (MAK: 52)

Rp.

1,00 M

MODAL (MAK: 53)

Rp.

2,00 M

SOSIAL (MAK: 57)

Rp.

1,00 M

 [Kembali](#)

Struktur anggaran K/L

Struktur Anggaran

Tampilkan Tabel Akumulasi Satker / SKPD

TOTAL ANGGARAN

Rp. **100000000000**

JUMLAH SATKER / SKPD

45

PEJABAT PENGHUBUNG

Pejabat Penghubung

PEGAWAI (MAK: 51)

Rp. **10000000000**

BARANG/JASA (MAK: 52)

Rp. **50000000000**

MODAL (MAK: 53)

Rp. **30000000000**

SOSIAL (MAK: 57)

Rp. **10000000000**

Simpan

Batal

Belanja Pegawai : Rp. **10.000.000.000**

Belanja Barang/Jasa : Rp. **50.000.000.000**

Modal : Rp. **30.000.000.000**

Sosial : Rp. **10.000.000.000**

Total : Rp. **100.000.000.000**


 **Kembali**

Rencana paket pengadaan

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										Swakelola		TOTAL	
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar				Penyedia + swakelola	
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
BARANG	4.393	0,00	465	0,00	1	0,00	3	0,00	67	0,00	-	-	4.929	0,00
KONSTRUKSI	555	0,00	279	0,00	4	0,00	1	0,00	151	0,00	-	-	990	0,00
KONSULTANSI	872	0,00	285	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00	-	-	1.167	0,00
JASA LAINNYA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00
Jumlah	5.820	0,00	1.029	0,00	5	0,00	4	0,00	228	0,00	765	0,00	7.851	0,00

- **Sumber Data** : Rencana Umum Pengadaan (Aplikasi SiRUP)
- **Metode Pengisian** : Sinkronisasi dengan Aplikasi SiRUP secara berkala

Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi';

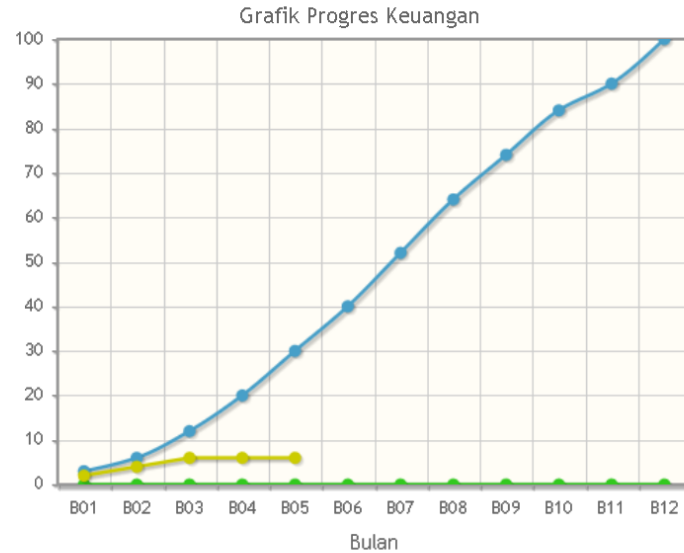

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	3.00%	6.00%	12.00%	20.00%	30.00%	40.00%	52.00%	64.00%	74.00%	84.00%	90.00%	100.00%
Proyeksi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Realisasi	2.20%	4.50%	6.90%	6.90%	6.90%	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data

: Realisasi Anggaran melalui SP2D

Metode Pengisian

: Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual

Frekuensi Pengisian

: Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi :
Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan

Batas Waktu Pengisian

: Target = Akhir Januari tahun berjalan;
Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ;
Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya


Revisi

: Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung

 **Kembali**

Penambahan fitur proyeksi keuangan

Progres Keuangan

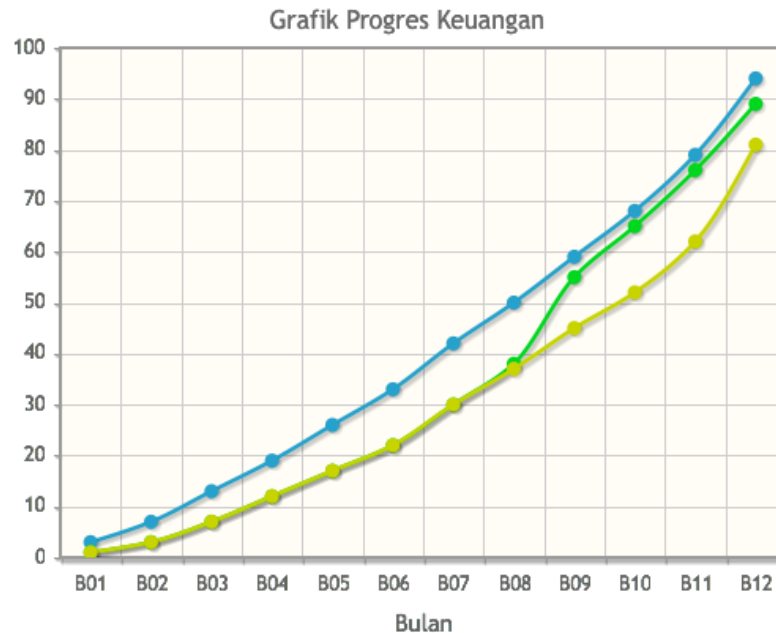

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	3.80%	7.50%	13.14%	19.79%	26.31%	33.92%	42.09%	50.34%	59.41%	68.75%	79.18%	94.12%
Proyeksi	1.57%	3.93%	7.58%	12.53%	17.52%	22.93%	30.44%	38.85%	55.83%	65.38%	76.21%	89.88%
Realisasi	1.43%	3.77%	7.51%	12.35%	17.32%	22.89%	30.39%	37.75%	45.33%	52.99%	62.05%	81.93%

Pejabat Penghubung diharapkan untuk melaporkan proyeksi realisasi keuangan untuk melihat proyeksi riil penyerapan pada bulan berjalan.

Proyeksi realisasi keuangan dapat dilihat sebagai target/perkiraan realistis realisasi keuangan di sisa tahun anggaran.


 **Kembali**

Progres Keuangan

[Pembaruan Progres Keuangan](#)

- Progres Keuangan untuk seluruh belanja
- Target: merupakan disbursement plan atau rencana penyerapan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara klik **Pembaruan Progres Keuangan**
- Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran dengan cara klik lapor pada setiap bulannya
- Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi
- Format pengisian merupakan nilai nominal (Rp) tanpa menggunakan titik/koma

Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi

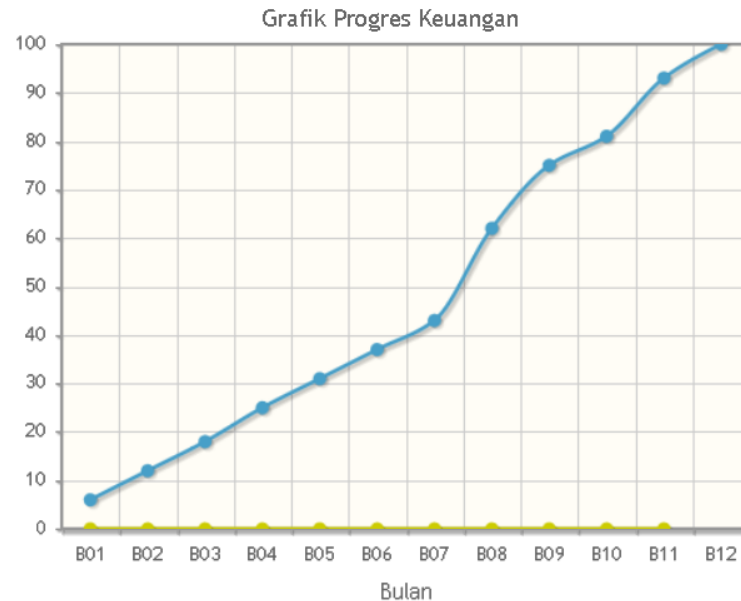

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	6.25%	12.50%	18.75%	25.00%	31.25%	37.50%	43.75%	62.50%	75.00%	81.25%	93.75%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-


Progres Keuangan

Bulan	Target	Realisasi
1	Rp.100.000.000.000	Rp.50.000.000.000
2	Rp.200.000.000.000	Rp.100.000.000.000
3	Rp.350.000.000.000	Rp.250.000.000.000
4	Rp.450.000.000.000	Rp.400.000.000.000
5	Rp.450.000.000.000	Rp.450.000.000.000
6	Rp.600.000.000.000	Rp.450.000.000.000
7	Rp.700.000.000.000	Rp.600.000.000.000
8	Rp.800.000.000.000	Rp.700.000.000.000
9	Rp.850.000.000.000	Rp.800.000.000.000
10	Rp.900.000.000.000	Rp.850.000.000.000
11	Rp.930.000.000.000	Rp.900.000.000.000
12	Rp.970.000.000.000	

Progres Keuangan

Total anggaran : Rp.1.000.000.000.000,0

	Target(Rp)	Proyeksi(Rp)	Realisasi(Rp)
Bulan 1	100000000000	0	50000000000
Bulan 2	200000000000	0	100000000000
Bulan 3	350000000000	0	250000000000
Bulan 4	450000000000	0	400000000000
Bulan 5	450000000000	0	450000000000
Bulan 6	600000000000	0	450000000000
Bulan 7	700000000000	0	600000000000
Bulan 8	800000000000	0	700000000000
Bulan 9	850000000000	0	800000000000
Bulan 10	900000000000	0	850000000000
Bulan 11	930000000000	0	900000000000
Bulan 12	970000000000	0	

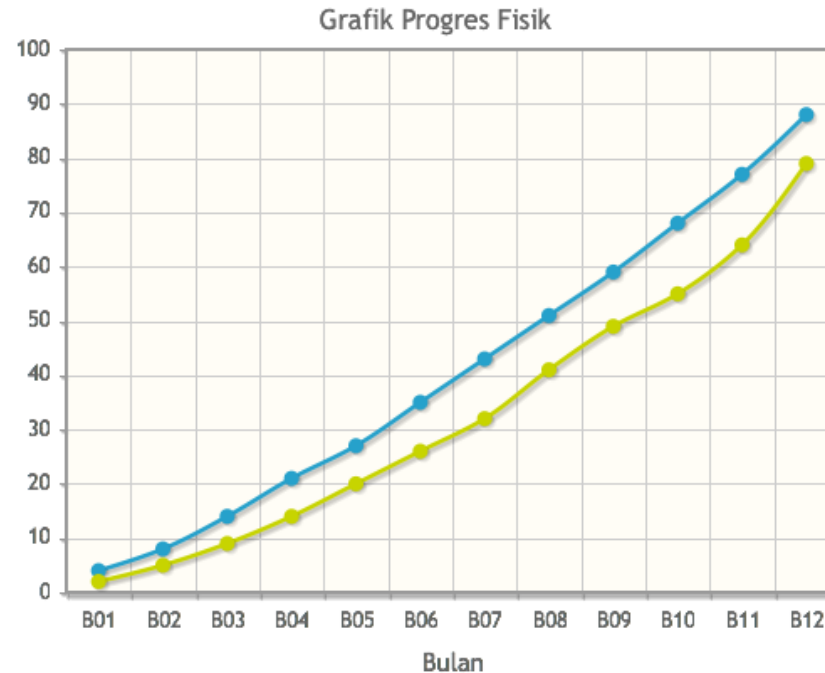

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	4.08%	8.39%	14.27%	21.01%	27.66%	35.68%	43.63%	51.30%	59.49%	68.49%	77.45%	88.93%
Realisasi	2.12%	5.11%	9.60%	14.94%	20.24%	26.14%	32.64%	41.28%	49.19%	55.94%	64.63%	79.19%

Sumber Data

: Realisasi output kegiatan

Metode Pengisian

: Manual baik target maupun realisasi

Frekuensi Pengisian

: Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan

Batas Waktu Pengisian

: Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan

berikutnya

Revisi

: Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung

 **Kembali**

Progres Fisik

☒ Pembaruan Progres Fisik

Kemajuan realisasi kegiatan yang dilaksanakan

- Progres fisik untuk seluruh belanja
- Target: merupakan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Diisi lengkap mulai dari B01 (Januari) hingga B12 (Desember) dengan cara klik Pembaruan Progres Fisik
- Realisasi: Diisi perbulan sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan dengan cara klik lapor pada setiap bulannya
- Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi
- Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)



	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Progres Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	0.2	1.2	7.5	15.5	25.75	40.57	60.17	67.17	75.47	80.47	86.47	98.47
Proyeksi												
Realisasi	0.1	1.1	6.1	13.4	24.40							

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target :	0,2%	1,2%	7,5%	15,5%	25,57%	40,57%	60,17%	67,17%	75,47%	80,47%	86,47%	98,47%
Realisasi :	0,1%	1,1%	6,1%	13,4%	24,40%							

Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 200 juta < 2.5 Miliar) : 43 paket / Rp. 0,00 M											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	2	3	4	5	10	18	22	29	32	39	39	-
	%	4.65%	6.98%	9.30%	11.63%	23.26%	41.86%	51.16%	67.44%	74.42%	90.70%	90.70%	-
Hasil Pemilihan	Paket	2	3	4	5	8	12	17	23	29	35	35	-
	%	4.65%	6.98%	9.30%	11.63%	18.60%	27.91%	39.53%	53.49%	67.44%	81.40%	81.40%	-
Kontrak	Paket	1	2	3	4	6	10	14	20	25	33	33	-
	%	2.33%	4.65%	6.98%	9.30%	13.95%	23.26%	32.56%	46.51%	58.14%	76.74%	76.74%	-
Serah Terima	Paket	0	0	1	3	4	8	12	18	22	27	27	-
	%	0.00%	0.00%	2.33%	6.98%	9.30%	18.60%	27.91%	41.86%	51.16%	62.79%	62.79%	-

Total paket dengan nilai > 200 Juta | <2,5 Miliar

Total Paket dengan nilai >2,5 Miliar | < 50 miliar

Total palet dengan nilai > 50 Miliar

Sumber Data : Realisasi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan nilai pagu

Metode Pengisian : Manual

Frekuensi Pengisian : Setiap Bulan

Batas Waktu Pengisian : Tanggal 15 bulan berikutnya

Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung

 **Kembali**

Proses Pengadaan Barang/Jasa

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

- Progres pengadaan barang dan jasa hanya untuk paket yang masuk dalam paket pengadaan strategis
- Target 100%: merupakan rencana realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
- Progres yang dimasukkan merupakan akumulasi
- Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45%)

 Pembaruan Realisasi

Pelaksanaan Pengadaan		Total Paket dengan nilai > 200 juta < 2.5 Miliar) : 212 paket / Rp. 0,00 ...											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Pemilihan/Pelaksanaan	Paket	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	%	0.47%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Hasil Pemilihan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Kontrak	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Serah Terima	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-

 Kembali

Proses Pengadaan Barang/Jasa

Koreksi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Paket : 212 Paket

Jumlah paket yang dimasukkan adalah nilai akumulatif pada bulan yang dimaksud

Total Paket dengan nilai (> 200 juta | < 2.5 Miliar)

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11
Pemilihan / Pelaksanaan				0	0	0	0	0	0	0	0
Hasil Pemilihan				0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrak				0	0	0	0	0	0	0	0
Serah Terima				0	0	0	0	0	0	0	0

	B01	B02	B03
Pemilihan/Pelaksanaan	: 10	50	100
Hasil Pemilihan	: 0	30	70
Kontrak	: 0	10	30
Serah Terima	: 0	0	10

 **Kembali**

TERIMA KASIH

